Planning Kulturhus De Spil Nieuwleusen d.d. 10-4-2017
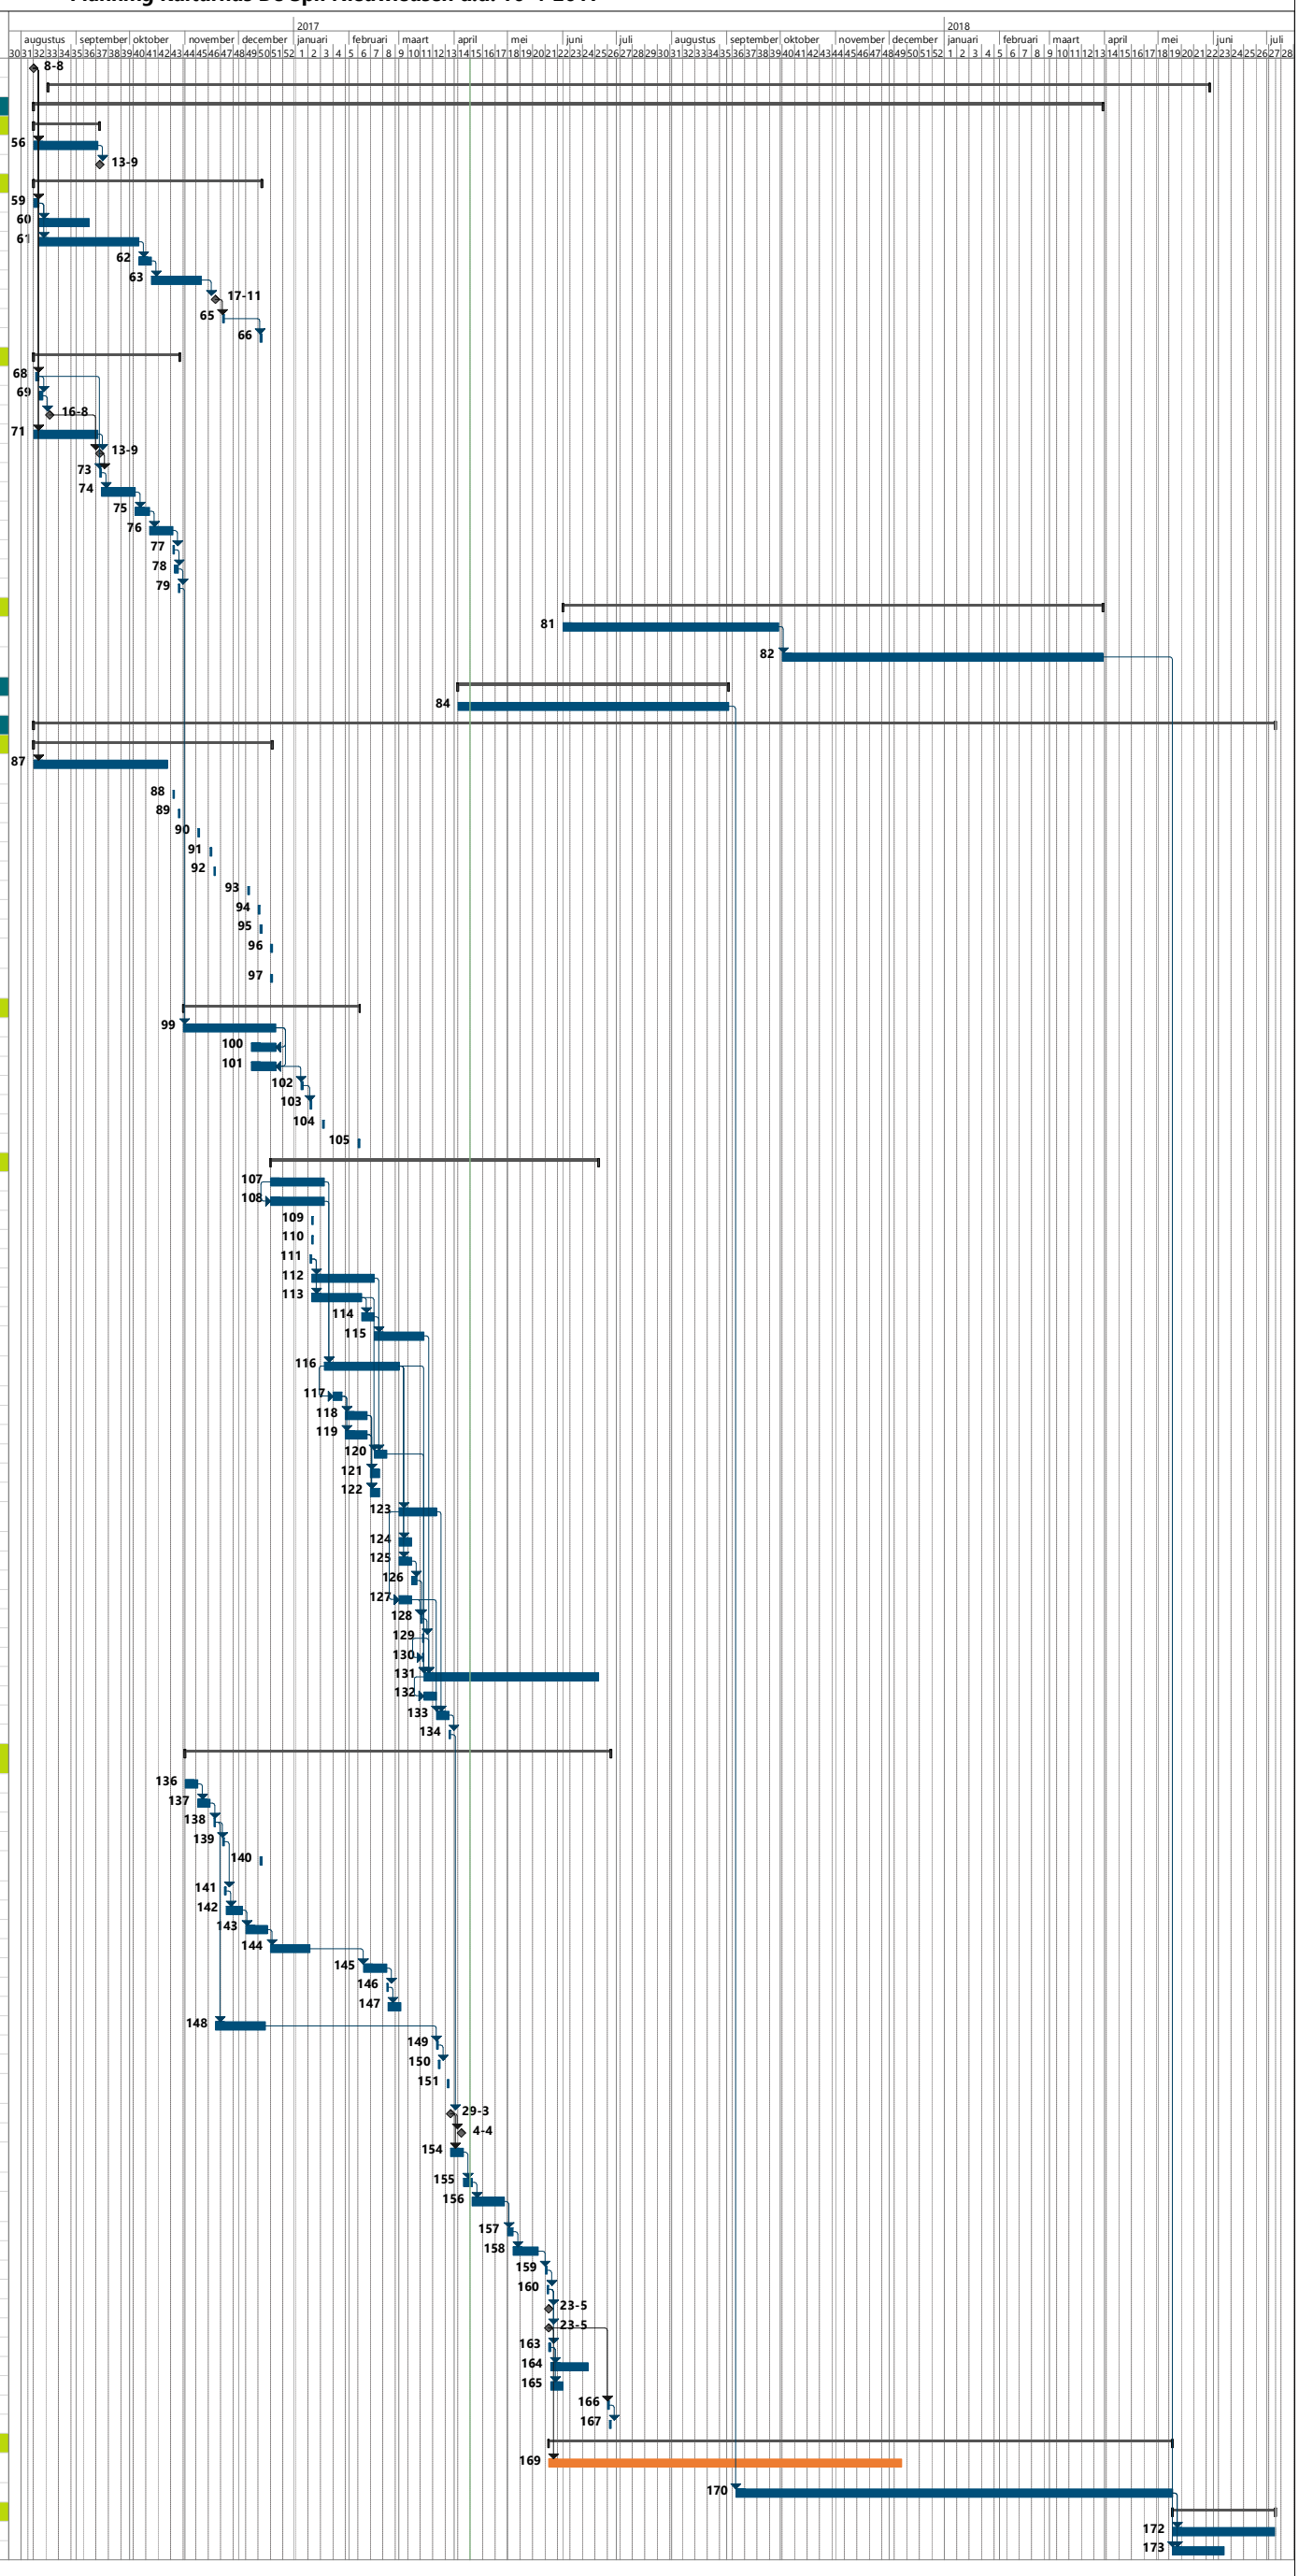
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	Start ABC Project	0 dagen	maa 8-8-16	maa 8-8-16
2	**Vergaderingen**	**466 dagen?**	**din 16-8-16**	**din 29-5-18**
54	**Algemeen**	**430 dagen**	**maa 8-8-16**	**vri 30-3-18**
55	**Kadernotitie**	**27 dagen**	**maa 8-8-16**	**din 13-9-16**
56	Opstellen kadernotitie	26 dagen	maa 8-8-16	maa 12-9-16
57	Besluitvorming Kadernotitie	1 dag	din 13-9-16	din 13-9-16
58	**RTF PvE**	**92 dagen**	**maa 8-8-16**	**din 13-12-16**
59	Verzamelen informatie	3 dagen	maa 8-8-16	woe 10-8-16
60	Houden interviews	20 dagen	don 11-8-16	woe 7-9-16
61	Opstellen concept RTF PvE	40 dagen	don 11-8-16	woe 5-10-16
62	Controle RTF PvE	5 dagen	don 6-10-16	woe 12-10-16
63	RTF PvE definitief maken	20 dagen	don 13-10-16	woe 9-11-16
64	Besluitvorming RTF PvE PG	1 dag	don 17-11-16	don 17-11-16
65	Besluitvorming RTF PvE SG	1 dag	din 22-11-16	din 22-11-16
66	Besluitvorming RTF PvE College B&W	1 dag	din 13-12-16	din 13-12-16
67	**Architecten & adviseursselectie (MVO)**	**60 dagen**	**maa 8-8-16**	**vri 28-10-16**
68	Opstellen longlist architecten en adviseurs	2 dagen	din 9-8-16	woe 10-8-16
69	Opstellen shortlist architecten en adviseurs	2 dagen	don 11-8-16	vri 12-8-16
70	Vaststellen shortlist architecten	0 dagen	din 16-8-16	din 16-8-16
71	Opstellen uitvraag architecten en adviseurs	26 dagen	maa 8-8-16	maa 12-9-16
72	Besluitvorming selectiestukken	1 dag	din 13-9-16	din 13-9-16
73	Toesturen uitvraag	1 dag	woe 14-9-16	woe 14-9-16
74	Geselecteerde partijen sturen vragen	13 dagen	don 15-9-16	maa 3-10-16
75	Nota van Inlichtingen schrijven en sturen	6 dagen	din 4-10-16	din 11-10-16
76	Indienen offertes architecten en adviseurs	9 dagen	woe 12-10-16	maa 24-10-16
77	Presentaties architecten en adviseurs	1 dag	din 25-10-16	din 25-10-16
78	Beoordeling en opstellen gunningsadvies	2 dagen	woe 26-10-16	don 27-10-16
79	Gunningsbesluit versturen	1 dag	vri 28-10-16	vri 28-10-16
80	**Onderzoek vleermuizen in oude sporthal**	**217 dagen**	**don 1-6-17**	**vri 30-3-18**
81	Onderzoek naar aanwezigheid vleermuizen in oude sporthal	87 dagen	don 1-6-17	vri 29-9-17
82	Aanvraag ontheffing Flora- & Faunawet (duur max 2x13 wkn)	26 wkn	maa 2-10-17	vri 30-3-18
83	**Terrein**	**110 dagen**	**maa 3-4-17**	**vri 1-9-17**
84	Bouwrijpmaken bouwlocatie	110 dagen	maa 3-4-17	vri 1-9-17
85	**Engineering en build deelproject 1,2,3**	**499 dagen**	**maa 8-8-16**	**don 5-7-18**
86	**Deelname Agnieten College**	**96 dagen**	**maa 8-8-16**	**maa 19-12-16**
87	Haalbaarheidsonderzoek deelname Agnieten College	55 dagen	maa 8-8-16	vri 21-10-16
88	Projectgroep	1 dag	din 25-10-16	din 25-10-16
89	Stuurgroep	1 dag	vri 28-10-16	vri 28-10-16
90	Laatste B&W	1 dag	din 8-11-16	din 8-11-16
91	Agendacie	1 dag	din 15-11-16	din 15-11-16
92	Verzending Commissie	1 dag	don 17-11-16	don 17-11-16
93	Commissie 1	1 dag	din 6-12-16	din 6-12-16
94	Commissie 2	1 dag	maa 12-12-16	maa 12-12-16
95	Verzending Raad	1 dag	din 13-12-16	din 13-12-16
96	Deadline besluitvorming deelname Agnieten College Raad	1 dag	maa 19-12-16	maa 19-12-16
97	Deadline besluitvorming deelname Agnieten College CvB Landstede	1 dag	maa 19-12-16	maa 19-12-16
98	**Voorlopig ontwerp**	**71 dagen**	**maa 31-10-16**	**maa 6-2-17**
99	Opstellen concept VO	38 dagen	maa 31-10-16	woe 21-12-16
100	Opstellen investeringsraming	10 dagen	don 8-12-16	woe 21-12-16
101	Opstellen fasedocument	10 dagen	don 8-12-16	woe 21-12-16
102	Besluitvorming VO door PG	1 dag	don 5-1-17	don 5-1-17
103	Besluitvorming VO door SG	1 dag	din 10-1-17	din 10-1-17
104	Besluitvorming VO door College van B&W	1 dag	din 17-1-17	din 17-1-17
105	Opiniëring VO door commissie	1 dag	maa 6-2-17	maa 6-2-17
106	**Definitief ontwerp**	**132 dagen**	**maa 19-12-16**	**din 20-6-17**
107	Uitwerken gevelontwerp	22 dagen	maa 19-12-16	din 17-1-17
108	Opzet BIM model (bouwkundig)	22 dagen	maa 19-12-16	din 17-1-17
109	Ateliersessie bouwkundig en installaties	1 dag	woe 11-1-17	woe 11-1-17
110	Definitieve input sporthalinrichting	1 dag	woe 11-1-17	woe 11-1-17
111	Kick off overleg tbv start BIM model	1 dag	din 10-1-17	din 10-1-17
112	Opzet BIM model constructief tbv indiening	25 dagen	woe 11-1-17	din 14-2-17
113	VO installaties	20 dagen	woe 11-1-17	din 7-2-17
114	Controle VO installaties opdrachtgever	5 dagen	woe 8-2-17	din 14-2-17
115	DO installaties, integreren /afronden BIM model	20 dagen	woe 15-2-17	din 14-3-17
116	DO bouwkundig, integreren/afronden BIM model	30 dagen	woe 18-1-17	din 28-2-17
117	Vooroverleg Welstand	5 dagen	maa 23-1-17	vri 27-1-17
118	Bouwbesluittoetsing (concept en definitief)	10 dagen	maa 30-1-17	vri 10-2-17
119	Brandveiligheid (concept en definitief)	10 dagen	maa 30-1-17	vri 10-2-17
120	Bouwbesluitvereisten constructie	5 dagen	woe 15-2-17	din 21-2-17
121	Overleg gemeente	5 dagen	maa 13-2-17	vri 17-2-17
122	Overleg brandweer	5 dagen	maa 13-2-17	vri 17-2-17
123	Technische omschrijving bouwkundig/constructief	15 dagen	woe 1-3-17	din 21-3-17
124	Afwerk-, kleur- en materiaalstaten	5 dagen	woe 1-3-17	din 7-3-17
125	Opstellen bouwdeelbegroting	5 dagen	woe 1-3-17	din 7-3-17
126	Toetsen bouwdeelbegroting op budget	3 dagen	woe 8-3-17	vri 10-3-17
127	Opstellen fasedocument	5 dagen	woe 1-3-17	din 7-3-17
128	Besluitvorming DO door PG	1 dag	maa 13-3-17	maa 13-3-17
129	Besluitvorming DO door SG	1 dag	din 14-3-17	din 14-3-17
130	Besluitvorming DO door College van B&W	1 dag	din 14-3-17	din 14-3-17
131	Omgevingsvergunning aanvragen	14 wkn	woe 15-3-17	din 20-6-17
132	Afronding BIM model	5 dagen	woe 15-3-17	din 21-3-17
133	Opstellen stukken tbv prijsvorming	5 dagen	woe 22-3-17	din 28-3-17
134	Verzenden stukken naar aannemers	1 dag	woe 29-3-17	woe 29-3-17
135	**EU Prijs & contractvorming E&B (UAV-GC) op basis van DO**	**171 dagen**	**din 1-11-16**	**din 27-6-17**
136	Concept selectiedocument	1 wk	din 1-11-16	maa 7-11-16
137	Definitief selectiedocument	1 wk	din 8-11-16	maa 14-11-16
138	Besluitvorming selectieleidraad E&B door PG	1 dag	don 17-11-16	don 17-11-16
139	Besluitvorming selectieleidraad E&B door SG	1 dag	din 22-11-16	din 22-11-16
140	Besluitvorming selectieleidraad E&B door College B&W	1 dag	din 13-12-16	din 13-12-16
141	Publicatie selectiedocument	1 dag	woe 23-11-16	woe 23-11-16
142	Geselecteerde partijen sturen vragen	7 dagen	don 24-11-16	vri 2-12-16
143	Nota van Inlichtingen selectiefase	2 wkn	maa 5-12-16	vri 16-12-16
144	Afronding indiening aanmelding	3,2 wkn	maa 19-12-16	maa 9-1-17
145	Besluitvorming selectiefase	9 dagen	don 9-2-17	din 21-2-17
146	Verzenden uitslag selectiefase	1 dag	woe 22-2-17	woe 22-2-17
147	Bezwaartermijn selectiefase (7 kalenderdagen)	5 dagen	don 23-2-17	woe 1-3-17
148	Opstellen gunningsleidraad	20 dagen	vri 18-11-16	don 15-12-16
149	Besluitvorming gunningsleidraad E&B door PG	1 dag	woe 22-3-17	woe 22-3-17
150	Besluitvorming gunningsleidraad E&B door SG	1 dag	don 23-3-17	don 23-3-17
151	Besluitvorming gunningsleidraad E&B door College B&W	1 dag	din 28-3-17	din 28-3-17
152	Start gunningsfase en toesturen DO	0 dagen	woe 29-3-17	woe 29-3-17
153	Schouw op locatie	0 dagen	din 4-4-17	din 4-4-17
154	Geselecteerde partijen sturen vragen in voor 1e NvI gunningsfase	5 dagen	don 30-3-17	woe 5-4-17
155	1e Nota van Inlichtingen schrijven	3 dagen	don 6-4-17	maa 10-4-17
156	Geselecteerde partijen sturen vragen in voor 2e NvI gunningfase	14 dagen	din 11-4-17	vri 28-4-17
157	2e Nota van Inlichtingen schrijven	3 dagen	maa 1-5-17	woe 3-5-17
158	Afronding aannemers inschrijving	10 dagen	don 4-5-17	woe 17-5-17
159	Presentaties	1 dag	maa 22-5-17	maa 22-5-17
160	Inschrijvingen beoordelen	1 dag	din 23-5-17	din 23-5-17
161	Gunningsbesluit E&B SG	0 dagen	din 23-5-17	din 23-5-17
162	Besluit College B&W	0 dagen	din 23-5-17	din 23-5-17
163	Voornemen tot gunning sturen	1 dag	woe 24-5-17	woe 24-5-17
164	Alcatel-periode (20 kalenderdagen)	15 dagen	don 25-5-17	woe 14-6-17
165	Ondertekening overeenkomsten	5 dagen	don 25-5-17	woe 31-5-17
166	GO/NO-GO moment gemeenteraad	1 dag	maa 26-6-17	maa 26-6-17
167	Definitieve gunning	1 dag	din 27-6-17	din 27-6-17
168	**Ontwikkeling en realisatie**	**250 dagen**	**woe 24-5-17**	**din 8-5-18**
169	Ontwikkelfase t/m uitvoeringsgereed ontwerp (UO)	142 dagen	woe 24-5-17	don 7-12-17
170	Realisatie Directievoering & Toezicht	175 dagen	woe 6-9-17	din 8-5-18
171	**Nazorg**	**42 dagen**	**woe 9-5-18**	**don 5-7-18**
172	Nazorg	42 dagen	woe 9-5-18	don 5-7-18
173	Sloop oude sporthal	21 dagen	woe 9-5-18	woe 6-6-18
